

K様邸新築工事現場検査記録簿

第2回目(基礎完了検査)

日時 2018年6月12日10:00-10:30

出席 渡邊氏・市村

天候 曇り

確認事項

レベルの確認

設計GL読み寸法=895ミリ

立ち上がり天端読み寸法=496~501ミリ

同上理論値=495ミリ


誤差=-1~-6ミリ

ベース天端読み寸法=840~850ミリ

同上理論値=855ミリ

誤差=+15~+5ミリ

対角の確認

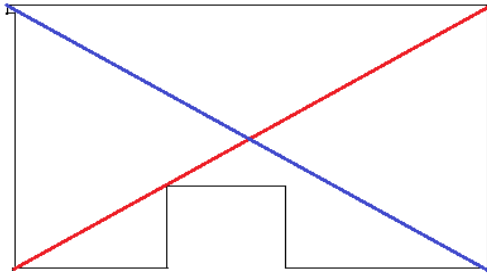

赤線 理論値=12451ミリ

実測値=12451ミリ

誤差=0

青線 理論値=12589ミリ

実測値=12585ミリ

誤差=-4ミリ

赤線



青線



アンカーボルトの出量・芯は問題ありません。

